ZORGPRESTATIE MODEL GGZ & FZ

Project Start: 3-02-21

Display Week: 1

feb 1, 2021 | feb 8, 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

m d w d v z z m d w d v z z

	WIE	PROGRESSIE	START	EINDE	DEADLINE CONCEPT
PRESTATIES EN SETTINGS					
Concept prestatiecodelijst en overige tabellen	NZa	100%	1-10-20	1-01-21	
Definitieve prestatiecodelijst en overige tabellen	NZa	80%	1-01-21	1-04-21	
Concept tarievenlijst	NZa	100%	1-10-20	1-11-20	
Definitieve tarievenlijst	NZa	60%	1-01-21	1-04-21	
Bepalen implicaties Wtza op indeling setting	NZa	50%	1-10-20	1-04-21	
In kaart brengen onmogelijk combinaties	NZa	20%	1-10-20	1-01-21	
REGELGEVING					
Nieuw concept regelgeving	NZa	100%	1-10-20	16-12-20	
Definitieve overgangsregelgeving NZa (inclusief harde stop)	NZa	100%	1-10-20	1-12-20	
Definitieve regelgeving NZa 2022	NZa	70%	1-10-20	1-04-21	
Tariefbeschikking	NZa	0%	1-04-21	1-06-21	
Regelgeving transitieprestatie	NZa	20%	1-10-20	1-04-21	
Aanpassing regelgeving acute ggz	NZa	20%	1-10-20	1-04-21	
Regeling minimale dataset (MDS)	NZa	50%	1-10-20	1-04-21	
Informatie op nota	NZa	80%	1-10-20	1-04-21	
AANVULLENDE VELDAFSPRAKEN					
Tekst veldafspraken opstellen	Werkgroep 3	30%	1-10-20	1-04-21	
Algemeen		40%	1-10-20	1-04-21	
Beroepen in de ggz en fz	Werkgroep 3	0%	1-10-20	1-04-21	
Verantwoording en controle	Werkgroep 3	70%	1-10-20	1-04-21	
Toepassing transitieprestatie	Werkgroep 3	0%	1-10-20	1-04-21	
Onderhoudscyclus veldafspraken bepalen	Programma	0%	1-10-20	1-04-21	
VERANTWOORDING EN CONTROLE					
Inhoud veldafspraken verantwoording en controle	Werkgroep 4	70%	1-10-20	1-04-21	
Minimale betrokkenheid regiebehandelaar	Werkgroep 4	100%	1-10-20	1-01-21	
Diagnostiek onverzekerde zorg	Werkgroep 4	100%	1-10-20	1-01-21	
Planning = realisatie	NZa	100%	1-10-20	1-01-21	
Overig	Werkgroep 4	70%	1-10-20	1-04-21	
Definiteve lijst verantwoording en controle	Werkgroep 4	50%	1-10-20	1-04-21	
VELDNORM BEROEPEN					
Resultaat veldraadpleging verwerken en beroepenlijst vaststellen	Werkgroep 5	100%	1-10-20	1-12-20	
Inhoud veldafspraken beroepen	Werkgroep 5	100%	1-10-20	1-01-21	
Opstellen veldnorm	Werkgroep 5	10%	1-10-20	1-01-22	
Afstemming met Zorginstituut deponering veldnorm	Programma	10%	1-10-20	1-03-21	
Proces richting veldnorm	Werkgroep 5	10%	1-10-20	1-03-21	
Onderhoud beroepenlijst	Werkgroep 5	0%	1-10-20	1-01-22	
Koppelen beroepenlijst aan interventies (wens ZN)	Programma	10%	1-10-20	1-01-22	
IMPLEMENTATIE					
Checklist implementatie versie 1.0	Werkgroep 6	100%	1-10-20	1-11-20	
Handreiking implementatie versie 1.0	Werkgroep 6	100%	1-11-20	1-12-20	
Implementatiemonitor	Programma				
Opdrachtverlening	Programma	0%		4-12-20	
Mijlpalen	Programma	0%		1-01-21	
Eerste monitor	Programma	0%		1-02-21	
ICT					
Vaststellen technisch beheer tabellen	Werkgroep 7	60%	1-01-21	1-01-21	1-02-21

Display Week: 1

feb 1, 2021 | feb 8, 2021

	WIE	PROGRESSIE	START		EINDE
Informatie mijn-omgeving definiëren	ZN	50%	1-01-21	1-01-21	1-03-21
Datamodel ZPM	Werkgroep 7/Redactie	50%	1-01-21	1-01-21	1-04-21
Codelijsten bekostiging (zorgprestaties, setting, beroepen, zorglabel)	NZa	70%	1-01-21	1-02-21	1-04-21
Codelijsten diagnose (DSM5, hoofdgroepen, aanspraak, basisggz profielen)	NZa	30%	1-01-21	1-02-21	1-04-21
Codelijsten zorgvraagtypering GGZ (zorgclusters en evt. sub clusters en superclusters, zor	NZa	0%	1-01-21	1-03-21	1-04-21
Codelijsten zorgvraagtypering FZ (aard delict, mate van gevaar, recidiverisicotaxatie, ern:	NZa	0%	1-01-21	1-03-21	1-04-21
Codelijsten veldafspraken (combinatietabellen prestaties/settings)	Veld	0%	1-01-21	1-03-21	1-04-21
Technische specificaties: elementen en structuur (incl zorglabel)	Werkgroep 7/Redactie	70%	1-01-21	1-02-21	1-04-21
Functionele/technische casuïstiek voor testen	?	0%	1-01-21	1-04-21	1-06-21
EI-standaard: PVE, BER, INV, RBC, XSD	Vektis	50%	1-01-21		1-03-21
EI-standaard : XSLT, test bestanden	Vektis	0%	1-01-21		1-04-21
Technische specificaties VeCoZo koppeling: declaratie	VeCoZo	0%	1-01-21		1-03-21
Technische specificaties VeCoZo koppeling: informatie verplichting aan de NZa	VeCoZo	0%	1-01-21		1-03-21
Technische specificaties: Informatieverplichtingen aan de NZa (bekostiging, FTE & ZVT)	NZa	0%	1-01-21	1-03-21	1-04-21
Zorgvraagtypering procesbeschrijving	SiRM / NZa	70%	1-01-21	1-02-21	1-03-21
Zorgvraagtypering uitleverscenario	NZa	0%	1-01-21	1-02-21	1-03-21
Zorgvraagtypering technisch algoritme	NZa	0%	1-01-21	1-02-21	1-04-21
Technische specificaties: zorgvraagtypering FZ	?	0%	1-01-21	1-03-21	1-04-21
Technische specificaties: zorgvraagtypering GGZ (basismodel met volledige Honosvragen	?	0%	1-01-21	1-03-21	1-04-21
Technische specificities: validaties (V&C – must haves, prio 1)	Werkgroep 4 & 7	0%	1-01-21	1-02-21	1-04-21
Technische specificities: validaties (V&C – must haves, prio 2)	Werkgroep 4 & 7	0%	1-01-21	1-03-21	1-04-21
Technische specificities: validaties (V&C – must haves, prio 3)	Werkgroep 4 & 7	0%	1-01-21	1-03-21	1-04-21
Definitieve technische specificities: validaties (V&C -nice to haves)	Werkgroep 4 & 7	0%	1-01-21	1-04-21	1-06-21
EI-standaard : Restitutienota	Vektis	0%	1-01-21		1-05-21
Voorbereiden aanpassingen systemen	Veld	20%	1-01-21		1-03-21
Aanpassen EPD's en overige systemen zorgaanbieder/zorgverzekeraars	Leveranciers	0%	1-01-21		1-10-21
Testen EPD's en overige systemen leveranciers	Leveranciers	0%	1-06-21		1-10-21
Ketentest: VeCoZo infrastructuur test	VeCoZo	0%	1-06-21		1-08-21
Ketentest: functionele test obv casuïstiek	Leveranciers/Veld	0%	1-08-21		1-12-21
Acceptatietest EPD's en overige systemen zorgaanbieder/zorgverzekeraars	Veld	0%	1-10-21		1-01-22
Doorontwikkeling/optimalisatie EPD's en overige systemen	Leveranciers/Veld	0%	1-01-22		
ZORGVRAAGTYPERING					
Input, algoritme en output vaststellen	Programma	30%	11-11-20		1-04-21
Doornemen workflow	Programma	30%	1-12-20		1-04-21
Subclusters bepalen	Programma	30%	1-12-20		1-04-21
Steekproefgrootte volledige HoNOS+	Programma	30%	1-12-20		1-04-21
Betrouwbaarheidspercentage	Programma	30%	1-12-20		1-04-21
Landelijke algoritme afleiding	Programma	30%	1-12-20		1-04-21
Praktijkhandleiding uitwerken	Programma	0%	11-11-20		1-04-21
Regelgeving zorgvraagtypering uitwerken	NZa	30%	11-11-20		1-04-21
COMMUNICATIE					
Veldcommunciatie (o.a. webinars)					
Webinars najaar (algemeen)	Werkgroep 9 en programma	100%	1-10-20		5-12-20
Webinars voorjaar (specifiek)	Werkgroep 9 en programma	0%	1-01-21		1-04-21
Helpdesk	Programma	0%	1-01-21		1-01-22
Regiobijeenkomsten	Werkgroep 9 en programma	0%	1-04-21		1-07-21
Communicatie aan patiënten	Werkgroep 9	0%	1-07-21		1-01-22
SIMULATIE					
Handreiking simulatie					

Display Week: 1
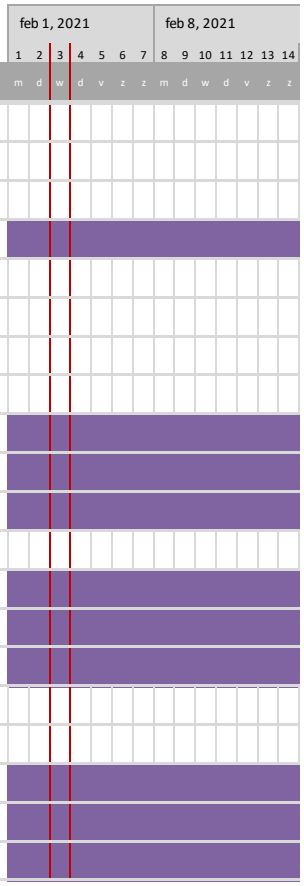
	WIE	PROGRESSIE	START	EINDE
Bepalen bruikbaarheid stappen macro-impactanalyse	Werkgroep 10	100%	1-10-20	1-11-20
Opstellen tabellen voor simulatie	Werkgroep 10	100%	1-10-20	1-01-21
Teksten handreiking opstellen	Werkgroep 10	100%	1-10-20	1-01-21
Simulatie door het veld	Veld	20%	1-01-21	1-05-21
Uitkomsten simulatie ophalen (en evt. aanpassingen)	Programma	0%	1-05-21	1-07-21
OVERGANG				
Harde stop ggz/afspraken 2021	Werkgroep 11	100%	1-10-20	1-10-20
Harde stop fz/afspraken 2021	Werkgroep 11	100%	1-10-20	1-11-20
Evalueren procesafspraken harde stop ggz en fz	Werkgroep 11	0%	1-01-21	1-07-21
Afspraken over overgang en transitieprestatie ggz per 2022	Werkgroep 11	20%	1-10-20	1-04-21
Afspraken over overgang en transitieprestatie fz per 2022	Werkgroep 11	20%	1-10-20	1-04-21
OVERIG				
Versterken contractering	Programma	0%	1-01-21	1-07-21
Maatregelen diagnostiek versterken	Programma	0%	1-01-21	1-04-21
Andere domeinen in ZPM? (consultatieve psych, zzp wlz, zzp fz)	Programma	0%	1-01-21	1-07-21
Onderhoud zorgprestatiemodel bepalen	Programma	0%		
AFSTEMMEN MET...				
Privacyaspecten zorgvraagtypering op nota	met AP	10%	1-01-21	1-03-21
Aanpassen risicoverevening	met ZINL	0%	1-01-21	1-04-21
Aanpassen verwijsafspraken	met VWS	10%	1-01-21	1-04-21
